

Pavillon im Friedhof



Vorarbeiten für den Pavillon im Friedhof sind im vollen Gang.

Der Standort wurde lt. genehmigten Bauplänen abgesteckt. Das Ausheben der Erde, mittels Kleinbagger ging professionell von statten. Ebenso die Abfuhr und Lagerung des Erdaushubs, der teilweise wieder zum einfüllen benötigt wird. Die Baugrube wurde mit Schotter befestigt. Somit ist geplant die Bodenplatte ab Montag einzuschalen Armierung einzubauen und kann dann betoniert werden. Der nächste Schritt wird es dann sein die Stützwände zu errichten.

Bevor die sehr alten Grabsteine (Epitaphe) vom Kirchhof zum Friedhof umziehen können, müssen diese Arbeiten erledigt werden.


Wir wünschen Gutes gelingen



Abstecken der Fläche



Ausheben der Erde

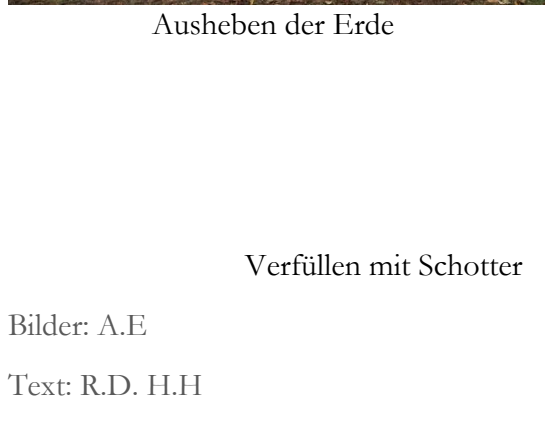

Verfüllen mit Schotter

Bilder: A.E

Text: R.D. H.H
